


北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)工事進ちょく状況

トンネル工事進ちょく状況

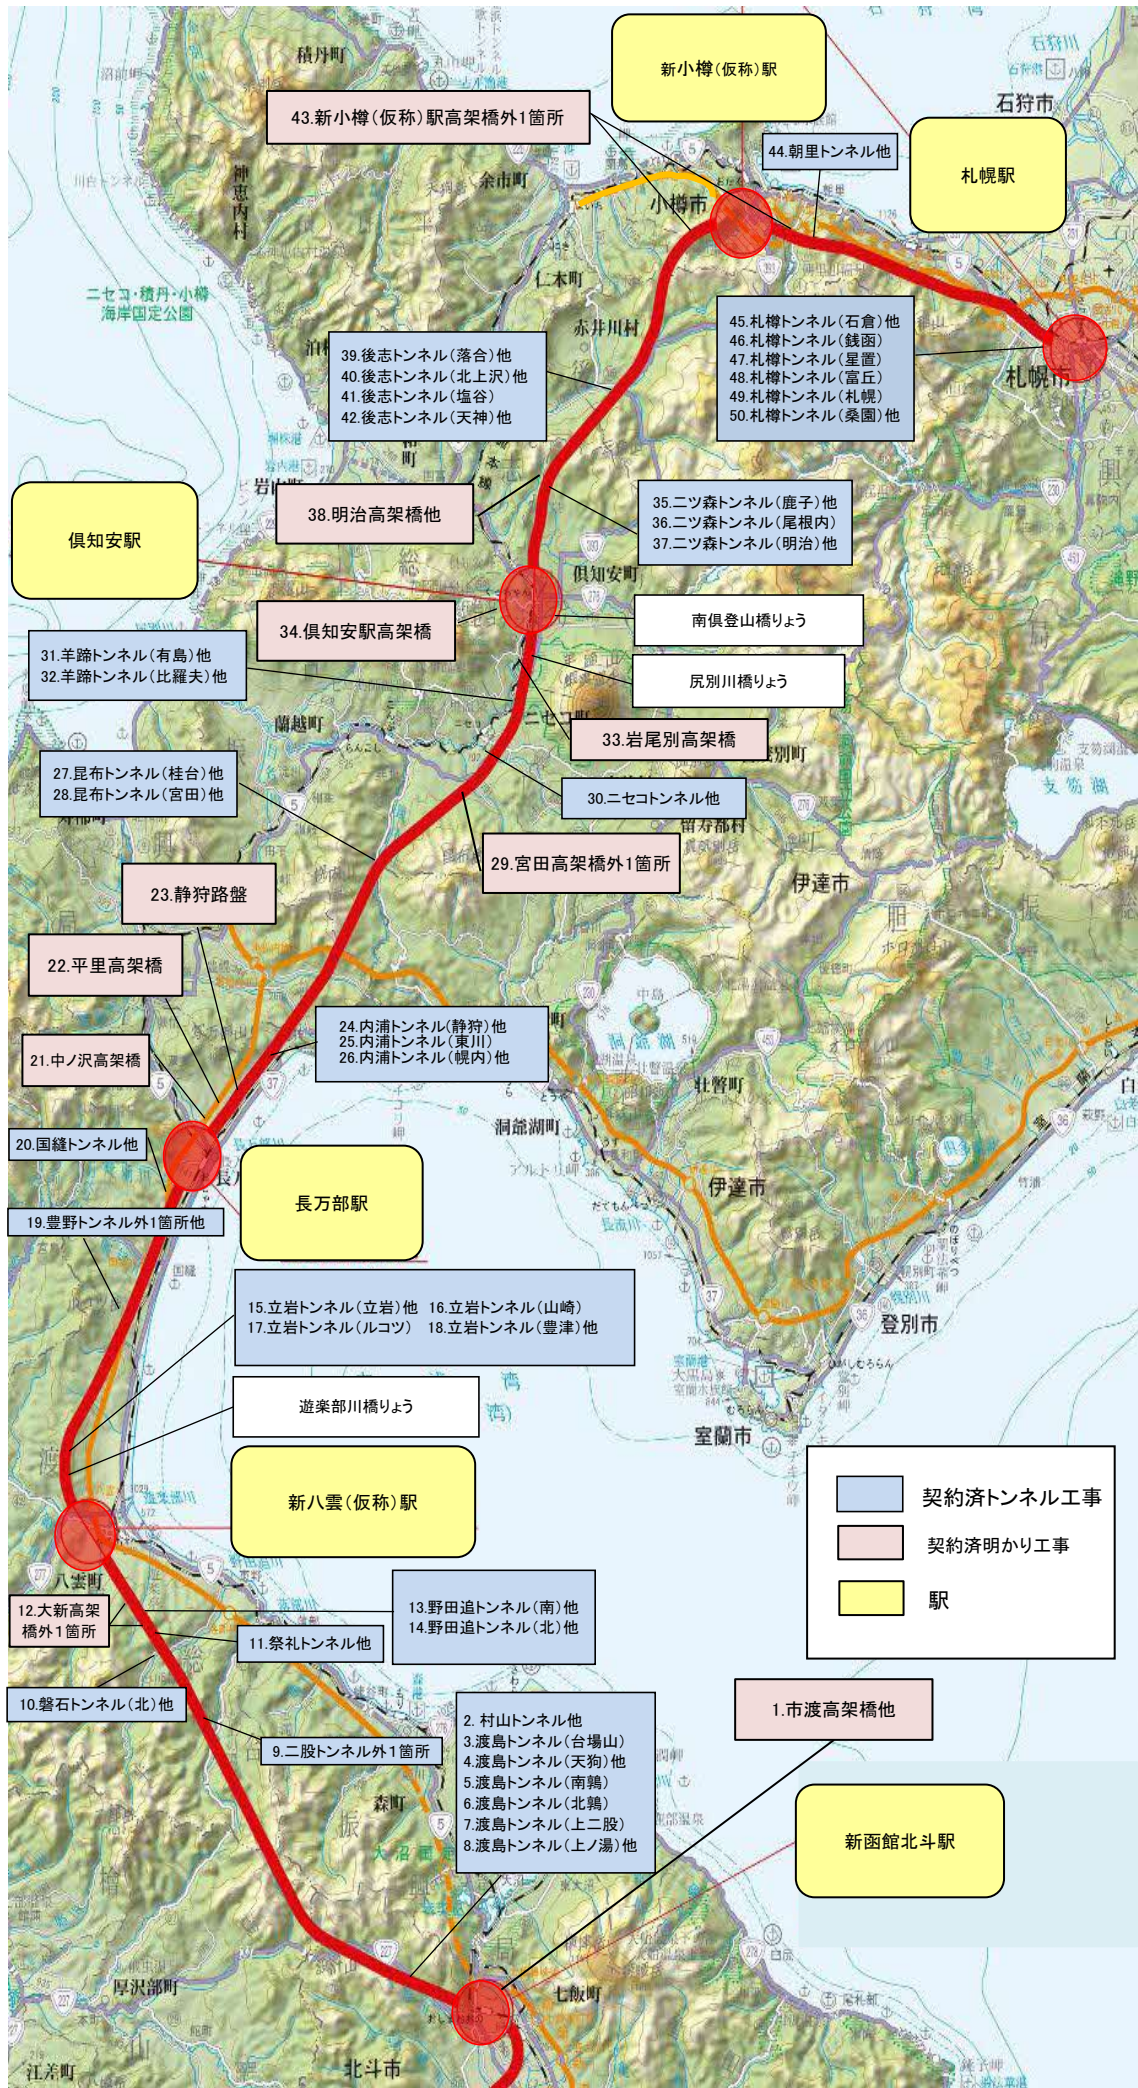

No	工区名	トンネル延長	掘削延長	掘削率	覆工	備考
2	村山トンネル他	5,365m	5,365m	100%	5,365m	計画変更により渡島トンネルと一本化
3	渡島トンネル(台場山)	3,500m	1,052m	30%	0m	
4	渡島トンネル(天狗)他	4,600m	2,689m	58%	1,386m	
5	渡島トンネル(南鶴)	4,400m	751m	17%	0m	
6	渡島トンネル(北鶴)	5,000m	4,154m	83%	2,966m	
7	渡島トンネル(上ノ湯)他	4,540m	1,927m	42%	0m	
8	渡島トンネル(上ノ湯)他	5,310m	2,721m	51%	1,844m	
9	二股トンネル外1箇所	3,100m	2,320m	75%	1,584m	磐石トンネル(南)を含む
10	磐石トンネル(北)他	3,150m	1,914m	61%	822m	
11	祭礼トンネル他	1,975m	1,975m	100%	1,584m	磐石トンネルと一本化 ※3
13	野田追トンネル(南)他	3,675m	3,453m	94%	2,181m	
14	野田追トンネル(北)他	4,550m	3,994m	88%	3,266m	
15	立岩トンネル(立岩)他	5,015m	5,015m	100%	4,796m	
16	立岩トンネル(山崎)	4,960m	3,210m	65%	1,974m	
17	立岩トンネル(ルコツ)	5,000m	4,743m	95%	3,878m	
18	立岩トンネル(豊津)他	2,065m	1,571m	76%	483m	
19	豊野トンネル外1箇所他	2,165m	1,513m	70%	896m	幌内トンネルを含む
20	国縫トンネル他	1,340m	1,340m	100%	136m	
24	内浦トンネル(静狩)他	5,570m	3,369m	60%	2,190m	
25	内浦トンネル(東川)	5,000m	1,763m	35%	564m	
26	内浦トンネル(幌内)他	5,000m	4,659m	93%	3,360m	
27	昆布トンネル(桂台)他	4,800m	4,800m	100%	4,769m	
28	昆布トンネル(宮田)他	5,710m	5,710m	100%	5,742m	宮田トンネルを含む
30	ニセコトンネル他	2,250m	2,250m	100%	2,046m	
31	羊蹄トンネル(有島)他	4,166m	1,072m	26%	0m	
32	羊蹄トンネル(比羅夫)他	5,569m	3,404m	61%	2,540m	
35	ニツ森トンネル(鹿子)他	4,780m	4,780m	100%	4,748m	
36	ニツ森トンネル(尾根内)	4,615m	3,140m	68%	1,920m	
37	ニツ森トンネル(明治)他	3,255m	572m	18%	0m	
39	後志トンネル(落合)他	4,865m	4,865m	100%	4,512m	
40	後志トンネル(北上沢)他	4,600m	4,600m	100%	4,543m	
41	後志トンネル(塩谷)	4,050m	1,637m	40%	288m	
42	後志トンネル(天神)他	4,460m	1,642m	37%	1,010m	
44	朝里トンネル他	4,328m	3,479m	80%	1,856m	
45	札樽トンネル(石倉)他	4,506m	739m	16%	0m	
46	札樽トンネル(銭函)	4,000m	175m	4%	0m	
47	札樽トンネル(星置)	4,400m	0m	0%	0m	斜坑掘削中 530.8m/570m
48	札樽トンネル(富丘)	4,500m	211m	5%	0m	
49	札樽トンネル(札幌)	8,446m	1,257m	15%	0m	
50	札樽トンネル(桑園)他	346m	24m	7%	0m	進ちょく率から求めた換算値
合 計		168,926m	103,856m	-	73,246m	※1

明かり工事進ちょく状況

No	工区名	延長	備考
1	市渡高架橋他	461m	高架橋、橋脚基礎工事中
12	大新高架橋外1箇所	2,873m	準備中
21	中ノ沢高架橋	1,876m	準備中
22	平里高架橋他	1,838m	準備中
23	静狩路盤	4,412m	準備中
29	宮田高架橋外1箇所	1,136m	準備中
33	岩尾別高架橋	2,354m	準備中
34	倶知安駅高架橋	3,160m	準備中
38	明治高架橋他	976m	準備中
43	新小樽(仮称)駅高架橋外1箇所	744m	準備中

進ちょく率

路盤	延長	契約率	掘削率※2
	211.9km	90%	61%

●工事状況

本坑掘削完了

本坑掘削中

作業坑掘削中

明かり工事施工中

準備中

10工区

29工区

1工区

1工区

9工区

計 50工区

※1: 単位未満四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

※2: 掘削率はトンネル実延長168,996mに対する掘削済延長の比率

1.市渡高架橋他

基礎工事状況



17.立岩トンネル(ルコツ)

防水工状況



26.内浦トンネル(幌内)他

坑内状況



36.ニツ森トンネル(尾根内)

FILM施工状況



42.後志トンネル(天神)他

覆工状況

