
北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)工事進ちょく状況

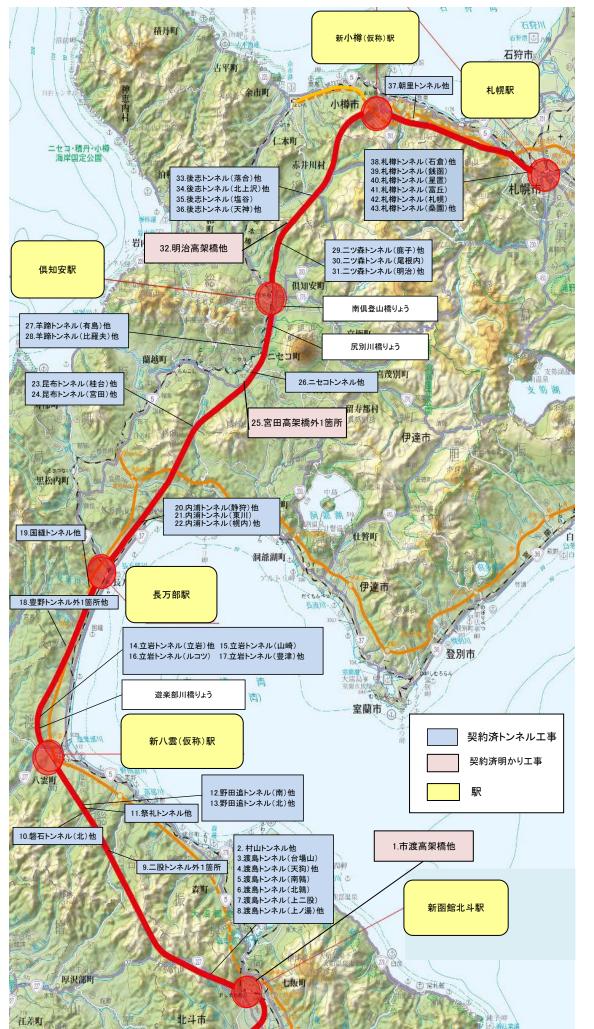

	トンネルエ事進ちょく状況					
No	工区名	トンネル延長	掘削延長	掘削率	覆工	備考
2	村山トンネル他	5,365m	5,365m	100%	5,365m	計画変更により渡島トンネルと一本化
3	渡島トンネル(台場山)	3,500m	1,008m	29%	0m	
4	渡島トンネル(天狗)他	4,600m	2,430m	53%	1,386m	
5	渡島トンネル(南鶉)	4,400m	650m	15%	0m	
6	渡島トンネル(北鶉)	5,000m	3,785m	76%	2,465m	
7	渡島トンネル(上二股)	4,540m	1,136m	25%	0m	
8	渡島トンネル(上ノ湯)他	5,265m	2,381m	45%	1,319m	
9	二股トンネル外1箇所	3,115m	1,784m	57%		磐石トンネル(南)を含む
10	磐石トンネル(北)他	3,150m	1,345m	43%	147m	
11	祭礼トンネル他	1,980m	1,967m	99%		磐石トンネルと一本化 ※3
12	野田追トンネル(南)他	3,675m	3,321m	90%	2,003m	
13	野田追トンネル(北)他	4,490m	3,992m	89%	2,993m	
14	立岩トンネル(立岩)他	5,015m	5,015m	100%	4,502m	
15	立岩トンネル(山崎)	4,960m	2,525m	51%	1,334m	
16	立岩トンネル(ルコツ)	5,000m	4,304m	86%	3,352m	
17	立岩トンネル(豊津)他	2,065m	1,269m	61%	42m	
18	豊野トンネル外1箇所他	2,105m	1,219m	58%		幌内トンネルを含む
19	国縫トンネル他	1,340m	1,127m	84%	0m	
20	内浦トンネル(静狩)他	5,570m	2,842m	51%	1,740m	
21	内浦トンネル(東川)	5,000m	1,375m	27%	156m	
22	内浦トンネル(幌内)他	5,000m	4,143m	83%	2,727m	
23	昆布トンネル(桂台)他	4,800m	4,800m	100%	4,769m	
24	昆布トンネル(宮田)他	5,710m	5,710m	100%		宮田トンネルを含む
26	ニセコトンネル他	2,270m	2,250m	99%	1,677m	
27	羊蹄トンネル(有島)他	4,181m	285m	7%	0m	
28	羊蹄トンネル(比羅夫)他	5,569m	3,404m	61%	2,327m	
29	ニツ森トンネル(鹿子)他	4,780m	4,780m	100%	4,748m	
30	ニツ森トンネル(尾根内)	4,615m	2,770m	60%	1,692m	
31	ニツ森トンネル(明治)他	3,255m	99m	3%	0m	
33	後志トンネル(落合)他	4,865m	4,803m	99%	4,343m	
34	後志トンネル(北上沢)他	4,600m	4,600m	100%	4,267m	
35	後志トンネル(塩谷)	4,050m	1,287m	32%	288m	
36	後志トンネル(天神)他	4,460m	1,189m	27%	438m	
37	朝里トンネル他	4,325m	3,092m	71%	1,509m	
	札樽トンネル(石倉)他	4,504m	702m	16%	<u>0m</u>	
39	札樽トンネル(銭函)	4,000m	0m	0%		斜坑掘削中 124m/397m
40	札樽トンネル(星置)	4,400m	0m	0%		斜坑掘削中 105m/570m
41	札樽トンネル(富丘)	4,500m	0m	0%	_	斜坑掘削中 753m/900m
42	札樽トンネル(札幌)	8,446m	180m	2%	<u>0m</u>	
43	札樽トンネル(桑園)他	346m	0m	0%	<u>0m</u>	
	合 計	168,811m	92,933m	_	63,989m	[: X:]

明かり工事進ちょく状況

No	工区名	延長	備考
1	市渡高架橋他	461m	高架橋、橋脚基礎工事中
25	宮田高架橋外1箇所	1,136m	準備中
32	明治高架橋他	976m	準備中

●工事状況

準備中

計

3工区

43工区

進ちょく率

路盤	延長	契約率	掘削率※2	本坑掘削完了	8工区
哈	211.9km	81%	55%	本坑掘削中	29工区
				作業坑掘削中	3工区

※1: 単位未満四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

※2: 掘削率はトンネル実延長169,168mに対する掘削済延長の比率

※3: 掘削率が100%未達の理由は、明かり巻き未施工のため。地山部の掘削は完了。

1.市渡高架橋他



16.立岩トンネル(ルコツ) 覆エセントル状況



22.内浦トンネル(幌内)他 FILM施工状況



30.二ツ森トンネル(尾根内) FILM施工状況



35.後志トンネル(天神)他 覆エセントル状況

