

北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)工事進ちょく状況

令和5年12月1日現在

1.市渡高架橋他

橋脚工事状況



19.立岩トンネル(ルコツ)

防水工状況



33.内浦トンネル(幌内)他

坑内状況



44.ニツ森トンネル(尾根内)

覆工状況



50.後志トンネル(天神)他

覆工状況



トンネル工事進ちょく状況


No	工区名	トンネル延長	掘削延長	掘削率	覆工	備考
2	村山トンネル他	5,365m	5,365m	100%	5,365m	計画変更により渡島トンネルと一本化
3	渡島トンネル(台場山)	3,500m	1,232m	35%	263m	
4	渡島トンネル(天狗)他	4,600m	3,281m	71%	1,796m	
5	渡島トンネル(南鶴)	4,400m	1,110m	25%	0m	
6	渡島トンネル(北鶴)	5,000m	4,748m	95%	3,490m	
7	渡島トンネル(上ノ股)	4,540m	3,164m	70%	24m	
8	渡島トンネル(上ノ湯)他	5,310m	3,418m	64%	2,786m	
9	二股トンネル外1箇所	3,100m	2,746m	89%	2,004m	磐石トンネル(南)を含む
10	磐石トンネル(北)他	3,150m	2,572m	82%	1,581m	
11	祭礼トンネル他	1,975m	1,975m	100%	1,836m	磐石トンネルと一本化 ※3
13	野田追トンネル(南)他	3,775m	3,722m	99%	2,378m	
14	野田追トンネル(北)他	4,450m	4,097m	92%	3,402m	
17	立岩トンネル(立岩)他	5,015m	5,015m	100%	4,977m	
18	立岩トンネル(山崎)	4,960m	4,188m	84%	2,846m	
19	立岩トンネル(ルコツ)	5,000m	5,000m	100%	4,154m	
20	立岩トンネル(豊津)他	2,065m	1,971m	95%	1,281m	
21	豊野トンネル外1箇所他	2,165m	1,916m	88%	1,243m	幌内トンネルを含む
22	国縫トンネル他	1,340m	1,340m	100%	1,047m	
31	内浦トンネル(静狩)他	5,570m	4,061m	73%	2,919m	
32	内浦トンネル(東川)	5,000m	2,421m	48%	1,016m	
33	内浦トンネル(幌内)他	5,000m	5,000m	100%	4,340m	
34	昆布トンネル(桂台)他	4,800m	4,800m	100%	4,769m	
35	昆布トンネル(宮田)他	5,710m	5,710m	100%	5,742m	宮田トンネルを含む
37	ニセコトンネル他	2,250m	2,250m	100%	2,250m	
38	羊蹄トンネル(有島)他	4,166m	2,019m	48%	645m	
39	羊蹄トンネル(比羅夫)他	5,569m	3,405m	61%	2,540m	
43	ニツ森トンネル(鹿子)他	4,780m	4,780m	100%	4,748m	
44	ニツ森トンネル(尾根内)	4,615m	3,683m	80%	2,353m	
45	ニツ森トンネル(明治)他	3,255m	986m	30%	237m	
47	後志トンネル(落合)他	4,865m	4,865m	100%	4,763m	
48	後志トンネル(北上沢)他	4,600m	4,600m	100%	4,543m	
49	後志トンネル(塩谷)	4,050m	2,289m	57%	288m	
50	後志トンネル(天神)他	4,460m	2,019m	45%	1,298m	
52	朝里トンネル他	4,328m	3,805m	88%	2,453m	
53	札幌トンネル(石倉)他	4,506m	1,403m	31%	0m	
54	札幌トンネル(銭函)	4,000m	919m	23%	0m	
55	札幌トンネル(星置)	4,400m	447m	10%	0m	
56	札幌トンネル(富丘)	4,500m	1,291m	29%	0m	
57	札幌トンネル(札幌)	8,446m	1,429m	17%	0m	
58	札幌トンネル(桑園)他	346m	93m	27%	0m	進ちょく率から求めた換算値
合 計		168,926m	119,134m	-	85,371m	※1

明かり工事進ちょく状況

No	工区名	延長	備考
1	市渡高架橋他	461m	高架橋、橋りょう工事中
12	大新高架橋外1箇所	2,883m	高架橋基礎工事中
15	新八雲(仮称)駅高架橋	1,178m	高架橋基礎工事中
16	遊楽部高架橋	1,083m	橋脚基礎工事中
23	国縫高架橋	2,138m	準備中
24	花岡高架橋	2,639m	準備中
25	中ノ沢高架橋	1,876m	高架橋、橋脚基礎工事中
26	平里高架橋他	1,838m	高架橋工事中
27	長万部駅高架橋	2,319m	準備中
28	栄原高架橋	2,534m	高架橋基礎工事中
29	共立路盤	3,921m	準備中
30	静狩路盤	4,390m	高架橋、橋脚基礎工事中
36	宮田高架橋外1箇所	1,136m	高架橋、橋脚基礎工事中
40	岩尾別高架橋	2,354m	高架橋、橋脚基礎工事中
41	倶知安駅高架橋	3,160m	高架橋、橋脚基礎工事中
42	琴平高架橋	3,395m	準備中
46	明治高架橋他	976m	高架橋、橋脚工事中
51	新小樽(仮称)駅高架橋外1箇所	360m	高架橋基礎工事中
58	札幌トンネル(桑園)他	659m	高架橋、橋脚基礎工事中
59	札幌車両基地高架橋	1,344m	高架橋、橋脚基礎工事中

設備工事進ちょく状況

No	工事種類	工区名	備考
60	軌道工事	基準器設置	基準器設置工事中

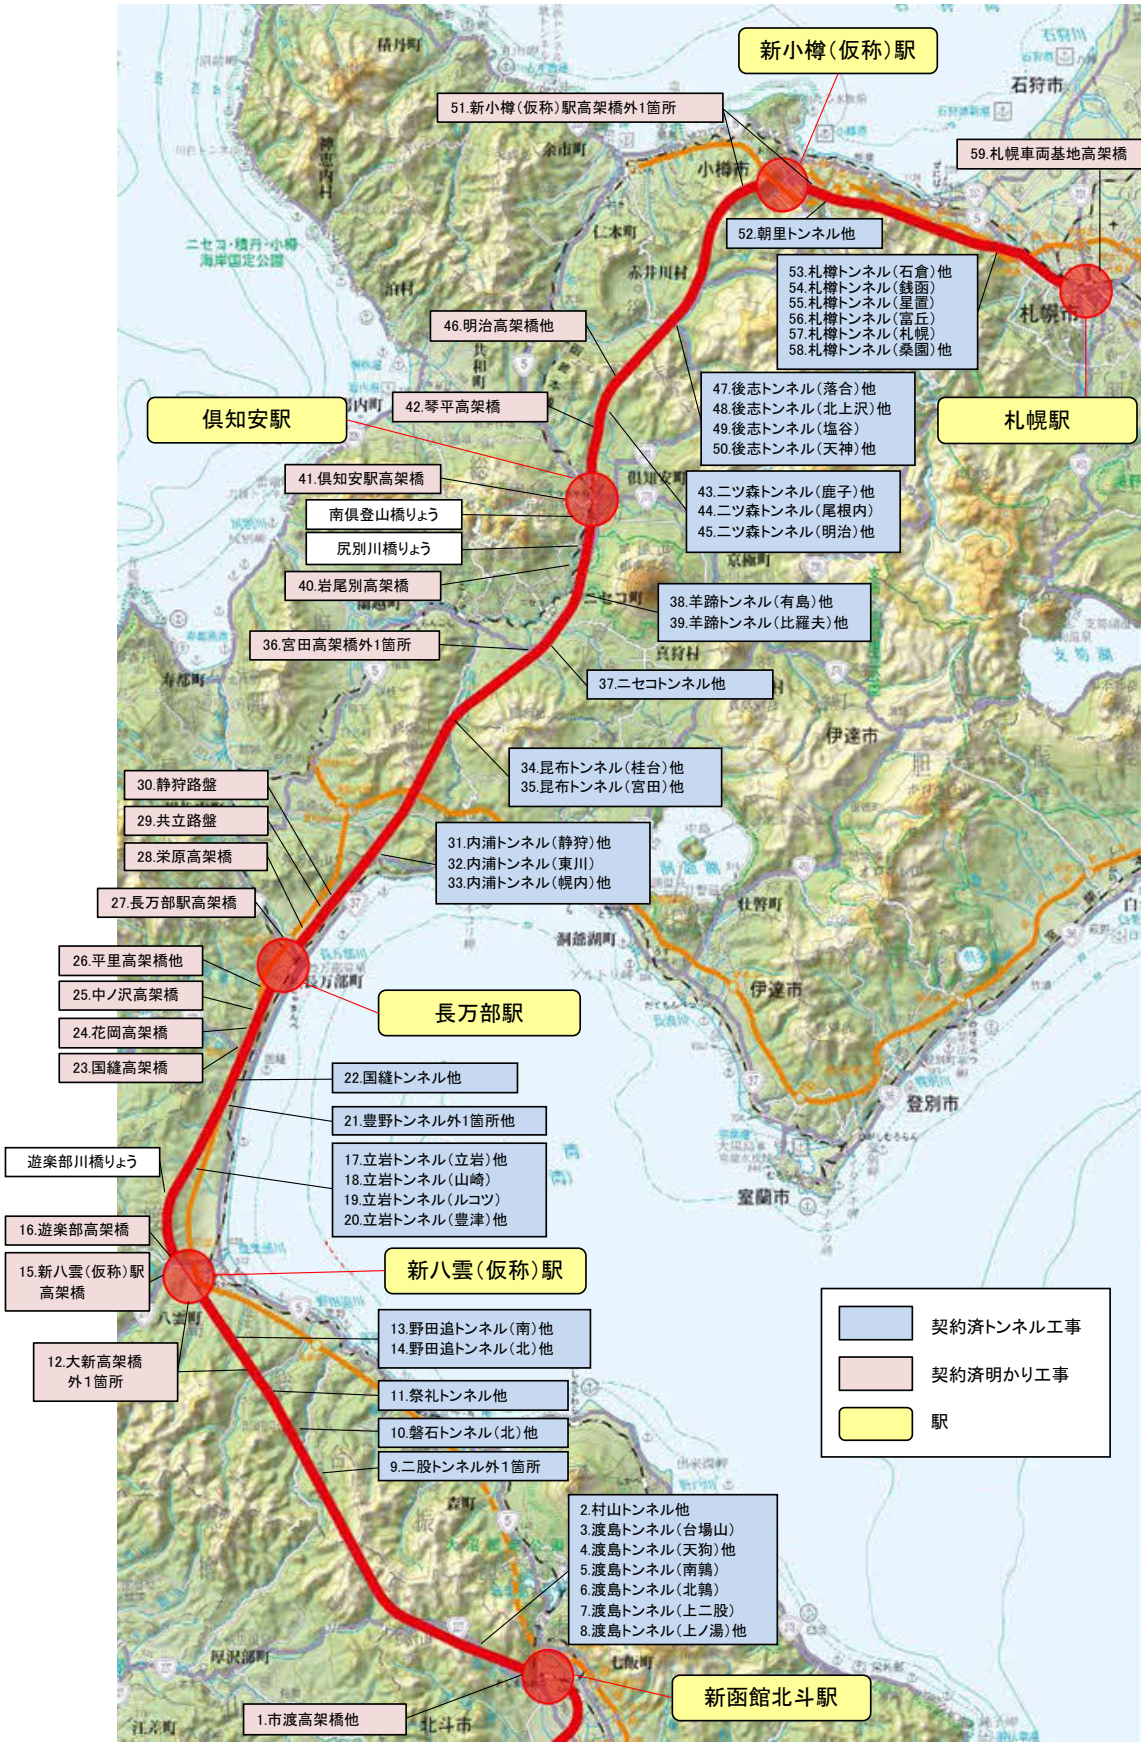

進ちょく率

路盤	延長	契約率	掘削率※2
	211.9km	99%	71%

●工事状況

本坑掘削完了

本坑掘削中

明かり工事施工中

準備中

計

12工区

28工区

14工区

5工区

59工区

※1: 単位未満四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
※2: 掘削率はトンネル実延長168,926mに対する掘削済延長の比率
