


北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)工事進ちょく状況

令和6年7月1日現在

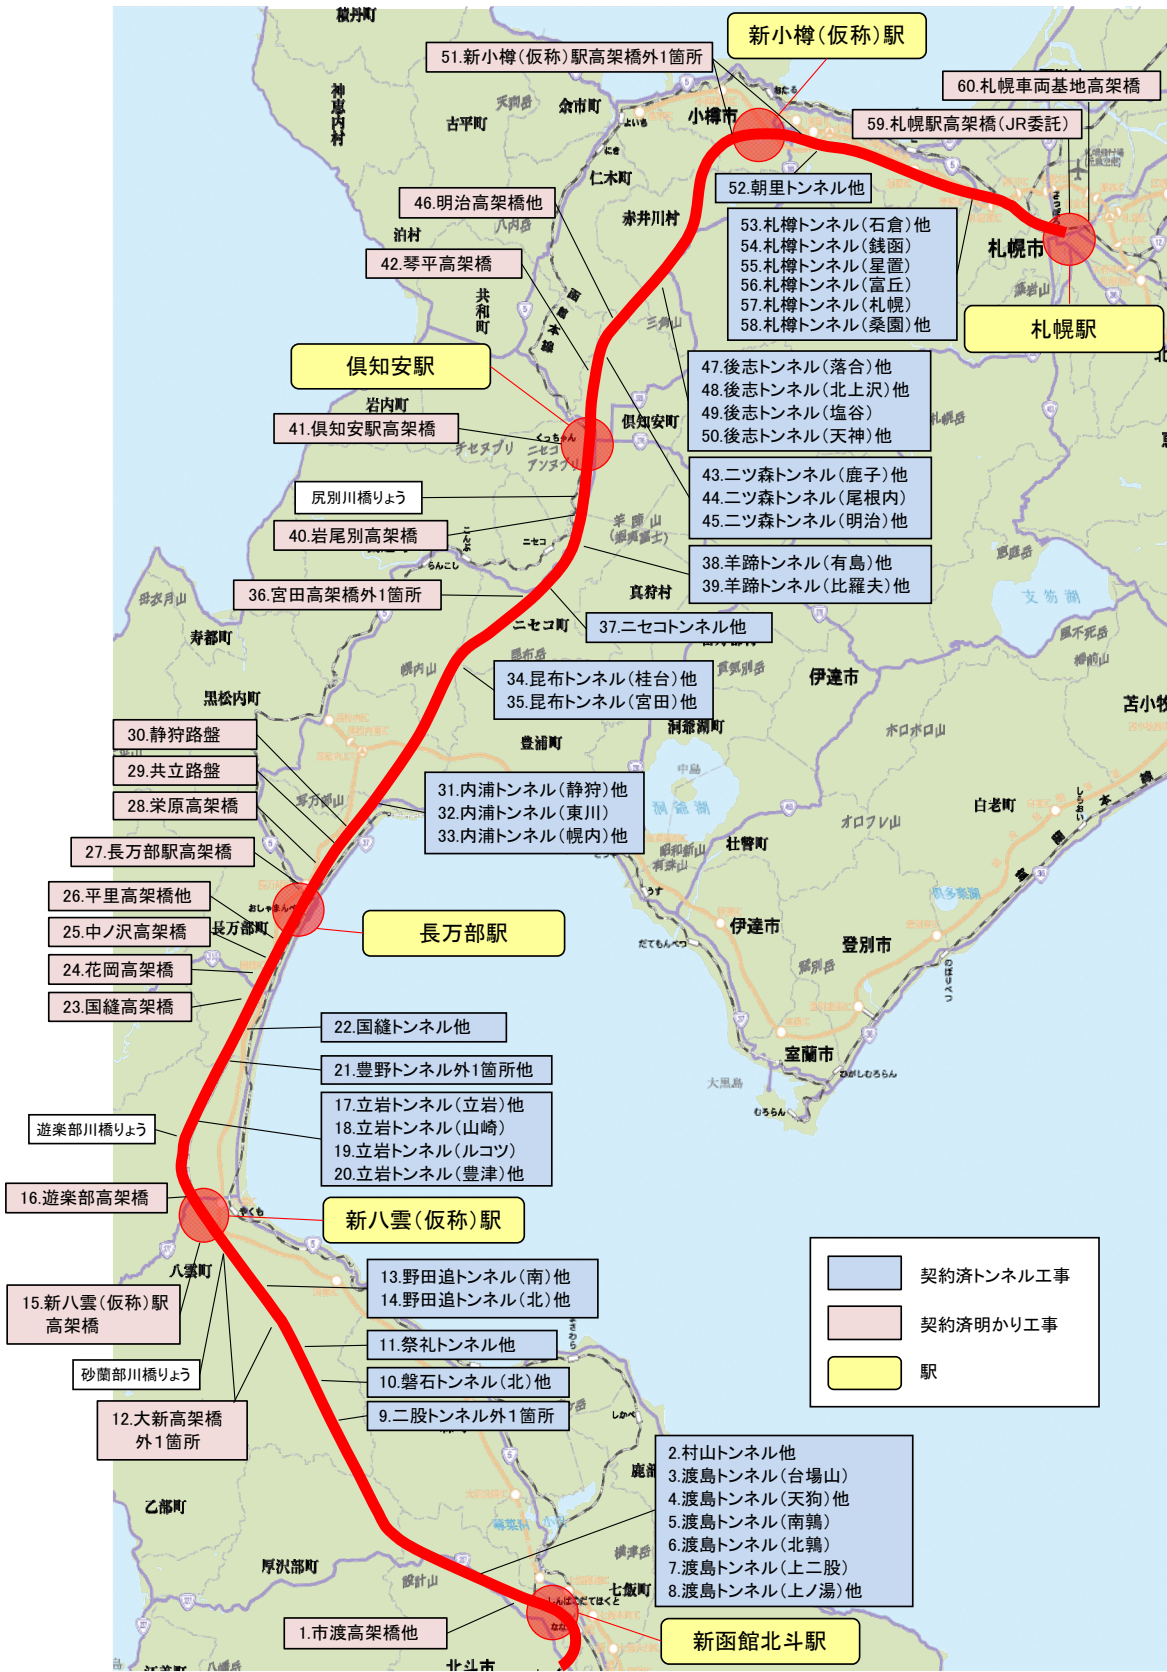

進ちょく率

路盤	延長	契約率	掘削率※2
	211.9km	99%	77%

● 工事状況

本坑掘削完了

本坑掘削中

明かり工事施工中

準備中

計

15工区

25工区

19工区

1工区

60工区

※1: 単位未満四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
※2: 掘削率はトンネル実延長168,926mに対する掘削済延長の比率

トンネル工事進ちょく状況

No	工区名	トンネル延長	掘削延長	掘削率	覆工	備考
2	村山トンネル他	5,365m	5,365m	100%	5,365m	計画変更により渡島トンネルと一本化
3	渡島トンネル(台場山)	3,500m	1,362m	39%	489m	
4	渡島トンネル(天狗)他	4,600m	3,724m	81%	2,037m	
5	渡島トンネル(南鶴)	3,900m	1,289m	33%	195m	
6	渡島トンネル(北鶴)	5,510m	5,156m	94%	3,668m	
7	渡島トンネル(上二股)	4,540m	3,767m	83%	740m	
8	渡島トンネル(上ノ湯)他	5,300m	4,011m	76%	3,287m	
9	二股トンネル外1箇所	3,100m	3,008m	97%	2,220m	磐石トンネル(南)を含む
10	磐石トンネル(北)他	3,150m	2,954m	94%	2,051m	
11	祭礼トンネル他	1,975m	1,975m	100%	1,857m	磐石トンネルと一本化 ※3
13	野田追トンネル(南)他	3,775m	3,775m	100%	2,772m	
14	野田追トンネル(北)他	4,450m	4,205m	94%	3,402m	
17	立岩トンネル(立岩)他	5,015m	5,015m	100%	4,977m	
18	立岩トンネル(山崎)	4,960m	4,889m	99%	3,539m	
19	立岩トンネル(ルコツ)	5,000m	5,000m	100%	4,654m	
20	立岩トンネル(豊津)他	2,065m	2,065m	100%	1,649m	
21	豊野トンネル外1箇所他	2,165m	2,165m	100%	1,610m	幌内トンネルを含む
22	国縫トンネル他	1,340m	1,340m	100%	1,340m	
31	内浦トンネル(静狩)他	5,570m	4,411m	79%	3,264m	
32	内浦トンネル(東川)	5,000m	2,830m	57%	1,383m	
33	内浦トンネル(幌内)他	5,000m	5,000m	100%	4,781m	
34	昆布トンネル(桂台)他	4,800m	4,800m	100%	4,769m	
35	昆布トンネル(宮田)他	5,710m	5,710m	100%	5,742m	宮田トンネルを含む
37	ニセコトンネル他	2,250m	2,250m	100%	2,250m	
38	羊蹄トンネル(有島)他	4,166m	2,464m	59%	1,233m	
39	羊蹄トンネル(比羅夫)他	5,569m	3,768m	68%	2,540m	
43	ニツ森トンネル(鹿子)他	4,780m	4,780m	100%	4,748m	
44	ニツ森トンネル(尾根内)	4,615m	4,161m	90%	2,606m	
45	ニツ森トンネル(明治)他	3,255m	1,557m	48%	812m	
47	後志トンネル(落合)他	4,865m	4,865m	100%	4,804m	
48	後志トンネル(北上沢)他	4,600m	4,600m	100%	4,543m	
49	後志トンネル(塩谷)	4,050m	2,957m	73%	288m	
50	後志トンネル(天神)他	4,460m	2,685m	60%	1,826m	
52	朝里トンネル他	4,328m	3,931m	91%	2,673m	
53	札樽トンネル(石倉)他	4,506m	1,996m	44%	0m	
54	札樽トンネル(銭函)	5,100m	1,387m	27%	0m	
55	札樽トンネル(星置)	3,300m	922m	28%	0m	
56	札樽トンネル(富丘)	4,500m	2,212m	49%	0m	
57	札樽トンネル(札幌)	8,446m	1,485m	18%	0m	
58	札樽トンネル(桑園)他	346m	125m	36%	0m	進ちょく率から求めた換算値
合 計		168,926m	129,959m	-	94,109m	※1

明かり工事進ちょく状況

No	工区名	延長	備考
1	市渡高架橋他	461m	高架橋、橋りょう工事中
12	大新高架橋外1箇所	2,883m	高架橋、橋脚工事中
15	新八雲(仮称)駅高架橋	1,178m	高架橋、橋脚基礎工事中
16	遊楽部高架橋	1,083m	高架橋、橋脚基礎工事中
23	国縫高架橋	2,138m	高架橋、橋脚基礎工事中
24	花岡高架橋	2,639m	高架橋、橋脚基礎工事中
25	中ノ沢高架橋	1,876m	高架橋、橋脚工事中
26	平里高架橋他	1,838m	高架橋、橋脚工事中
27	長万部駅高架橋	2,319m	準備中
28	栄原高架橋	2,534m	高架橋、橋脚工事中
29	共立路盤	3,921m	高架橋、橋脚基礎工事中
30	静狩路盤	4,390m	高架橋、橋脚工事中
36	宮田高架橋外1箇所	1,136m	高架橋、橋脚工事中
40	岩尾別高架橋	2,354m	高架橋、橋脚基礎工事中
41	倶知安駅高架橋	3,160m	高架橋、橋脚工事中
42	琴平高架橋	3,395m	高架橋、橋脚基礎工事中
46	明治高架橋他	976m	高架橋、橋脚工事中
51	新小樽(仮称)駅高架橋外1箇所	360m	高架橋、橋脚基礎工事中
58	札樽トンネル(桑園)他	659m	高架橋、橋脚基礎工事中
59	札幌駅高架橋(JR委託)	799m	新幹線高架橋、在来線改修工事中
60	札幌車両基地高架橋	1,344m	高架橋、橋脚工事中

設備工事進ちょく状況

No	工事種類	工区名	備考
61	軌道工事	基準器設置	基準器設置工事中
62	軌道工事	渡島南軌道敷設	準備中

1.市渡高架橋他

高架橋工事状況



19.立岩トンネル(ルコツ)

坑内状況



33.内浦トンネル(幌内)他

坑内状況



44.ニツ森トンネル(尾根内)

坑内状況



50.後志トンネル(天神)他

坑内状況

